


FREIGHT MAINTENANCE ACTIVITIES

फ्रेट अनुरक्षण गतिविधियां

समाडि संगठन संरचना

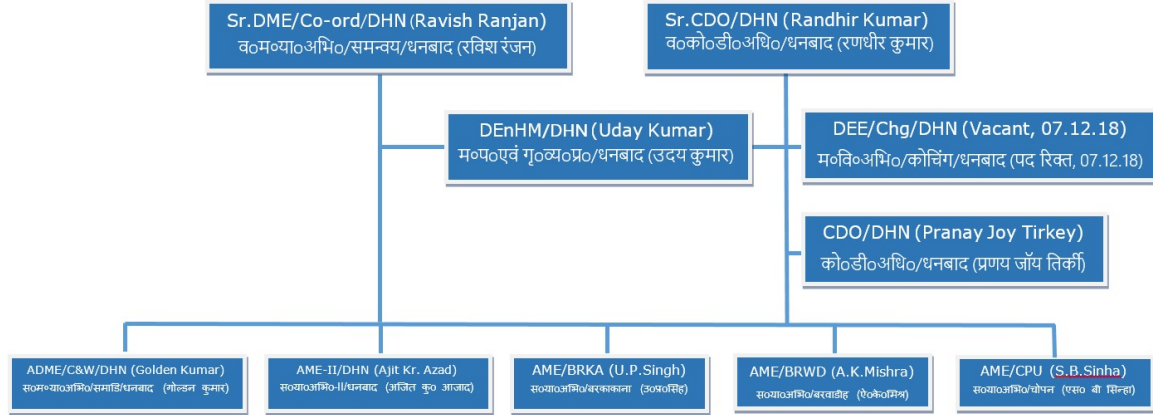

(A) Major Freight depots: Barwadih, Obra, Patherdih & Patratu
प्रमुख फ्रेट डिपो: बरवाडीह, ओबराडैम, पाथरडीह, पतरातू

	PEH/ पाथरडीह	PTRU/ पतरातू	BRWD/बरवाडीह	OBRA ओबराडैम
Type of examination निरिक्षण के प्रकार	BOXN CC rake BPC Validity: 30+5 days or 7500 Kms. बोक्सन सी० सी० रक बी०पी०सी० की वैद्यता: 35+5 दिन अथवा 7500 की०मी०	BOXNHL based CC rakes BPC validity: 35+5 days or 10000 Kms. बोक्सनएचएल सी०सी०रेक बी०पी०सी० की वैद्यता: 35+5 दिन अथवा 10000 की०मी०	BOBRN based CC rakes BPC validity: 30+5 days or 7500 Kms. बीओबीआरएन सी०सी०रेक बी०पी०सी० की वैद्यता: 35+5 दिन अथवा 7500 की०मी०	बीटीएपी सी०सी०रेक बी०पी०सी० की वैद्यता: 35+5 दिन अथवा 7500 की०मी०
	Premium Examination प्रीमियम एग्जामिनेशन	Premium Examination प्रीमियम एग्जामिनेशन	Premium examination प्रीमियम एग्जामिनेशन	Premium examination प्रीमियम एग्जामिनेशन
	End to End examination एंड से एंड एग्जामिनेशन	End to End examination एंड से एंड एग्जामिनेशन	End to End examination एंड से एंड एग्जामिनेशन	End to End examination एंड से एंड एग्जामिनेशन
	BOBRN Door checking बीओबीआरएन वैगन की डोर चेकिंग	--	BOBRN Door checking बीओबीआरएन वैगन की डोर चेकिंग	BOXN Door checking/secure बोक्सन वैगन की डोर चेकिंग

(B) Sick line sheds/सिक लाइन शेड:

Sick line/ROH सिक लाइन/आरओएच	BRWD	OBRA	PEH	PTRU
Sick line availability सिक लाइन की उपलब्धता	Yes/हाँ	Yes/हाँ	Yes/हाँ	Yes/हाँ
ROH facility आरओएच की उपलब्धता	Yes/हाँ	--	--	--
Category of repairs विभिन्न प्रकार के अनुरक्षण	General mechanical and A, B, C Category repair, सामान्य यांत्रिक अनुरक्षण, एवं ऐ, बी, सी कैटेगरी अनुरक्षण ROH/ आरओएच Trolley repair section, ट्राली अनुरक्षण विभाग Wheel turning/ चक्का टर्निंग CTRB mounting/dismounting, सीटीआरबी माउंटिंग एवं उनमाउंटिंग UST facility of axle, ऐक्सल के यूएसटी की सुविधा Overhauling section of Air brake system एयर ब्रेक सिस्टम के ओवरहालिंग सेक्शन	General mechanical & A, B, C category repair सामान्य यांत्रिक अनुरक्षण, एवं ऐ, बी, सी कैटेगरी अनुरक्षण	General mechanical & A, B, C category repair	General mechanical & A, B, C category repair

(C) Minor Freight depots: GMO, KDS, KTH, KQR, PUS, RAY, GHD, SKTN, SGRL

छोटे फ्रेट डिपो: गोमो, कुसुंडा, कतरास, कोडरमा, फुसरो, राय, गढ़वा, शक्तिनगर, सिंगरौली

SN क्र०	C&W Activities समाधि गतिविधियाँ	GMO गोमो	KDS कुसुंडा	KTH कतरास	KQR कोडरमा	PUS फुसरो	RAY राय	GHD गढ़वा	SKTN शक्तिनगर	SGRL सिंगरौली
1.	BOBRN Door checking & repairing बीओबीआरएन दरवाजों की जाँच एवं अनुरक्षण	--	Yes हाँ	Yes हाँ	--	Yes हाँ	Yes हाँ	--	Yes हाँ	Yes हाँ
2.	Attention of en-route trouble shooting चलती रेलगाड़ी में होने वाली समस्या-समाधान गतिविधियों पर विशेष ध्यान	Yes हाँ	Yes हाँ	Yes हाँ	Yes हाँ	Yes हाँ	Yes हाँ	Yes हाँ	Yes हाँ	Yes हाँ
3.	Attention of critical & maintenance alarms received from WILD वाइल्ड सिस्टम के क्रिटिकल एवं मेंटेनेंस अलार्म वाले कोच एवं वैगन की जाँच	--	--	--	--	--	--	Yes हाँ	--	--
4.	Yard Repair Work of BOXN & BOBRN unloadable wagons through outsourcing बोक्सन एवं बीओबीआरएन अनुपयुक्त वैगन के यार्ड में आउटसोर्स के द्वारा अनुरक्षण	--	Yes हाँ	Yes हाँ			Yes हाँ	--	Yes हाँ	--
5.	Monitoring of On Train Welding Repairing	--	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	--	Yes	Yes

	(OTWR) Work through outsourcing आउटसोर्सिंग के माध्यम से ऑन-ट्रेन वेल्डिंग मरम्मत (OTWR) कार्य की निगरानी		हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ		हाँ	हाँ
6.	Attention of critical alarms received from HABD HABD से प्राप्त महत्वपूर्ण अलार्मों पर ध्यान	Yes हाँ	--	--	--	--	--	Yes हाँ	Yes हाँ	Yes हाँ

(B) Railway owned Weighbridges/रेलवे के स्वामित्व वाले वजन पुल (वेब्रिज):

SN क्र०	Station स्टेशन	Make मेक	D.O.C. कॉमिसनिंग की तिथि	SN क्र०	Station स्टेशन	Make मेक	D.O.C. कॉमिसनिंग की तिथि
1	Latehar लातेहार	PIPL	14.12.2017	9	Koderma कोडरमा	Essae	14.08.2019
2	Meralgram मेरालग्राम	PIPL	28.12.2017	10	Karela Road करेला रोड	Essae	11.07.2019
3	Renukoot रेनुकूट	Rice Lake	26.11.2016	11	Chopan चोपन	Essae	02.08.2019
4	SGRL सिंगरौली	Rice Lake	20.10.2016	12	Gomoh-1 गोमो - 1	Essae	23.10.2019
5	Chainpur चैनपुर	Rice Lake	31.05.2017	13	Gomoh-2 गोमो - 2	Essae	23.10.2019
6	Dugda दुग्धा	Rice Lake	21.08.2017	14	Krishnashila कृष्णाशिला	Essae	18.08.2021
7	Mahadiya महदिया	SPIL	12.09.2014	15	Dhanbad धनबाद	Essae	07/12/2021
8	Barkakana बरकाकाना	Essae	25.05.2019				

(C) Position of FIO Test Van/Dhanbad/एफ.आई.ओ. टेस्ट वैन/धनबाद की स्थिति

1.	Test van no./टेस्ट वैन संख्या BCN(M-1) 30079264799	4.	Test van no./टेस्ट वैन संख्या BCN(M-1) 30079460542
2.	Test van no./टेस्ट वैन संख्या BCN 30039063028	5.	Test van no./टेस्ट वैन संख्या BCNA 30019360598
3.	Test van no./टेस्ट वैन संख्या BCN 30089865887	6.	Empty-wagon no./खाली टेस्ट वैन संख्या BCNA 30019431069

(D) Position of FIO Test Van/Barwadih/एफ.आई.ओ. टेस्ट वैन/बरवाडीह की स्थिति

1.	Test van no./टेस्ट वैन संख्या SE-BCN-106876	4.	Test van no./टेस्ट वैन संख्या ER-BCN-51831
2.	Test van no./टेस्ट वैन संख्या NF-BCN-36477	5.	Test van no./टेस्ट वैन संख्या NR-BCN-92187
3.	Test van no./टेस्ट वैन संख्या SE-BCN-130929	6.	Empty-wagon no./टेस्ट वैन संख्या NR-BCNMI-110674

(E) Diesel Water Pumps for water supply: Total stations: 07

पानी की आपूर्ति के लिए डीज़ल जल पंप: कुल स्टेशन: 07

Name of Station: स्टेशन का नाम	Parasnath पारसनाथ	Latehar लातेहार	Mc Cluskieganj मैक लुस्किगंज	Jogidih जोगीडिह	Gurmura गुरमुरा	Dudhi Nagar दुधि नगर	Nagaruntari नगर उंटारी
No. of Pump: पंपों की संख्या	2	2	2	2	1	2	2

(F) **Highlights for the month of April-26**

1. **Highest Ever Examination in One day:** 21 Rakes examined in one day in Division on 15th April, 2026. This is highest ever examination in one day over this Division. Previous highest was 19 rakes examined in one day during 2025-26.
2. **Substantial increase in rake examination:** Rake examination in current month was 438 rakes, whereas, rake examination in previous year was **347 rakes**. Thus, nearly **26% higher than previous F.Y.**
3. **Extensive increase in repair of C-Category wagons** during current month **296 wagons repaired** which was only **195 wagons** in previous FY. **101** additional wagons repaired as C-Category as compared to same month of Last year.
4. **Appreciable Increase in repair of wagons at sick lines over Dhanbad Division:** An increase of 6% is registered in repair of wagons at sick lines during current F.Y. as compared to same month in last F.Y. April-25: 1611, April-26: 1704.
5. **Significant Increase in Unloadable Repair of Wagons at Sidings:** Unloadable repair of wagons at sidings of Division has increased by nearly 12% during the current F.Y. wrt previous F.Y. (Apr-25: 25029, Apr-26: 28029)
6. **Rehabilitation work of 700 BOXNHL wagon:** Work completed during April-2026.
7. **Nil Asset Failure Cases (Logged in ICMS):** This has happened for the first time that Nil Asset Failure Cases has been logged in ICMS during April-2026.
8. **Wagon ineffective within target: Average daily** Wagon ineffective during current month was 204 wagons which was within the target of 210 wagons (as per previous FY).
9. **Commissioning of Weigh-Bridges: Three** new railway owned Weigh-bridges were commissioned during the year 2025-26 (Biratoli, Bandhua & Kushmahi). Also, commissioning of **three** more weighbridges is in progress. Progress as below:
 - a. **Bhurkunda station** received on 18/12/2025, commissioning work completed on 16/04/26. Commercial notification

b. Padma station received on 23/01/26, commissioning work in progress. RCC & PCC casting completed. Waiting for block for slab installation.

c. Katrasgarh station received on 08/01/26. Slab casting completed on 29/03/26. Waiting for block for slab installation.

10. Installation and commissioning of RFID reader at PEH: Joint survey for installation of RFID reader completed, three sites finalized. All three sites Trenching, ducting and back filling done. Pit foundation work for equipment installation completed. Commissioning expected to be completed during May-2026.

11. Progress of fitment of RFID tags in wagons: 12911 RFID tags fitted in 8120 wagons at freight depots of Dhanbad Division upto Apr-2026.

Procurement and Commissioning of HABDs: 05 nos of HABD for DEMU (02), CNF (01), DSME (01) and MWF (01) has been received on 24.03.2026. Installation of DEMU (02) equipment completed, commissioning in progress.

(G) Repair of wagons in sick line & In-Situ Repair in yard during examination/सिकलाइन में वैगनों की मरम्मत तथा निरीक्षण के दौरान यार्ड में इन-सीटू (स्थान पर ही) मरम्मत

	F.Y. वर्ष	Sick Line Repair सिक लाइन अनुरक्षण	In-Situ Yard Repair इन-सीटू यार्ड अनुरक्षण
Av./Month प्रति माह औसत	25-26	1611	6578
	26-27	1742	7472
	% Improvement	8%	14%

(H) Summary of Yard Examination
यार्ड निरीक्षण का सारांश

FY	CC	PR	EE	Total
2025-26	63	180	127	370
2026-27	76	131	275	482
% Improvement	30%			

(I) Summary of Door Checking of BOBRN rakes
BOBRN रेक्स के दरवाजों की जांच का सारांश

	KDS कुसुंडा	KTH कतरास	PUS फुसरो	RAY राय	SKTN शक्तिनगर	SGRL सिंगरौली	PEH पाथरडीह	BRWD बरवाडीह	TOTAL कुल
Av/Mon 25-26 औसत प्रतिमाह	65	59	115	98	31	0.9	56	0.6	425
Av/Mon 26-27 औसत प्रतिमाह	38	48	96	84	40	2	11	2	319

(J) Repair of unsuitable BOXN wagons at sidings:**साइडिंग पर अनुपयुक्त BOXN वैगनों की मरम्मत:**

- (i) Outsourcing of 24 Mobile Units for 51 Wharf loading sidings,
51 व्हार्फ लोडिंग साइडिंग्स के लिए 23 मोबाइल यूनिट्स का आउटसोर्सिंग
- (ii) West Bokaro Siding (TATA), Chainpur.
वेस्ट बोकारो साइडिंग (TATA), चैनपुर

	2024-25	2025-26	2026-27	
No. of wagons repaired	26998	25029	28089	12%
Av. Monthly Wagon Repair	26998	25029	28089	
Equivalent No. of additional rakes loaded	465.5	431.5	484.3	
Additional loading in Million Tonnes	1.917	1.777	1.994	
Additional Revenue ensured	175.5	162.7	182.6	

(K) Turning of BOXN Wheels and UST of wheel Axles at BRWD/ बरवाडीह में बोकसन पहियों की

टर्निंग और पहियों के एक्सल का अल्ट्रासोनिक परीक्षण:

	2025-26	2026-27	% Increase प्रतिशत वृद्धि
Av. No. of Wheels Turned & UST done of Axles कुल चक्कों की संख्या जिसकी टर्निंग की गयी एवं कुल अक्सले जिनकी यूएसटी की गयी	1105	870	-

(L) CASNUB Trolley Repair at ROH Shed BRWD/ आरओएच शेड बरवाडीह में कैशनब ट्रॉली की मरम्मत:

Months माह	NLB एन एल बी	HS एच एस	MBS एम बी एस	WM डब्लू एम	EL इ एल	Total कुल
Av/Mon औसत प्रति माह	94	128	124	0	10	356

(M) Overhauling of wagon Brake Components/ वैगन ब्रेक घटकों का ओवरहालिंग

2025-26	APM (KBD) ए पी एम (के बी डी)	APM (EKD) ए पी एम (इकेडी)	DV डीवी	SAB एस ऐ बी	Bk.Cyl Conv ब्रेक सिलिंडर (कन्वेंशनल)	Bk.Cyl KBD ब्रेक सिलिंडर (के बी डी)	Bk.Cyl EKD ब्रेक सिलिंडर (इकेडी)	D/Cyl डोर सिलिंडर	A/Cock एंगल कॉक
Av/Mon औसत प्रति माह	2	0	39	16	18	0	0	3	57

(N) **Type wise ROH Repair of Wagons/वैगनों की प्रकारानुसार आरओएच मरम्मत:** during current month-277, Cumulative: 2598/वर्तमान माह में-277, संचयी-2598

Month माह	2025-26										
	BOXN बोक्सन	NHL एनएचएल	BTAP बीटीएपी	BCN बीसीएन	BRN बीआरएन	BOBR/RN बीओबीआरएन	BOST बोएसट	BTPN बीटीपीएन	BOBYN बीओबीव्हाईएन	BVCM बीवीसीएम	TOTAL कुल
Total कुल	29	48	0	0	0	112	0	0	0	3	192
Av/Mon औसत प्रति माह	29	48	0	0	0	112	0	0	0	3	192
%-age प्रतिशत	15%	25%	0%	0%	0%	58%	0%	0%	0%	2%	100%

(O) **Fitment of RFID in wagons/वैगनों में आरएफआईडी की फिटमेंट:**

Depot	Current Month		Total	
	No. of wagons	RFID fitted	No. of wagons	RFID fitted
BRWD	251	462	3665	4620
PEH	67	117	1693	3182
PTRU	101	129	1880	2447
OBRA	83	123	1819	2671
Total	502	831	9057	12920

(P) **Progress of works in Division as per guidelines of RDSO/Railway Board:**
RDSO/रेलवे बोर्ड के दिशानिर्देशों के अनुसार डिवीजन में कार्यों की प्रगति

Name of work/कार्य का नाम	2026-27	Cumulative संचयी
Replacement of BMBS Brake Cylinders of KB Design of 10 Inch Diameter by 11 Inch Diameter is being carried out by the firm M/S Knorr Bremse at BRWD depot. BRWD डिपो में फर्म M/S Knorr Bremse द्वारा KB डिजाइन के 10 इंच व्यास के BMBS ब्रेक सिलेंडरों को 11 इंच व्यास के सिलेंडरों से बदलने का कार्य किया जा रहा है।	18	990
Replacement of Bell Crank with new modified Bell Crank in Escort Design BMBS wagons at BRWD depot is being carried out by the firm M/S Escort. BRWD डिपो में फर्म M/S Escort द्वारा Escort डिजाइन के BMBS वैगनों में बेल क्रैंक को नए संशोधित बेल क्रैंक से बदलने का कार्य किया जा रहा है।	05	577
Work of Blocking of Two diagonal doors of BOXN wagons as per ED (Wagon), RDSO letter No. MW/BOXNHL, dt. 21/03/23 being done at PEH, PTRU & OBRA: Work started from December-2023. BOXN वैगनों के दो विकर्ण दरवाजों को ब्लॉक करने का कार्य ED (Wagon), RDSO पत्र संख्या MW/BOXNHL, दिनांक 21/03/23 के अनुसार PEH, PTRU और OBRA में किया जा रहा है: कार्य दिसंबर 2023 से प्रारंभ हुआ।	PEH : 26 PTRU : 00 BRWD : 00 <u>OBRA : 53</u> TOTAL: 79	PEH : 1116 PTRU : 611 BRWD : 201 <u>OBRA : 753</u> TOTAL : 2681

- (Q) Heavy Body Repair of 1416 BOXN (142)/BONXHL (1274) wagons at Sick Line, PEH Depot through outsourcing/PEH डिपो के सिक लाइन में 1416 BOXN (142)/BONXHL (1274) वैगनों की भारी बॉडी मरम्मत आउटसोर्सिंग के माध्यम से:**

Location/स्थान	Sick Line, PEH/DHN Division/सिक लाइन, पाथरडीह/धनबाद मंडल
Date of LOA/एलओए की तिथि	14/07/2023
Date of Commencement of work/कार्य प्रारंभ की तिथि	08/11/2023
Work Progress/कार्य प्रगति	1104 Wagons (BOXNHL: 962, BOXN: 142) 1104 वैगन (BOXNHL: 962, BOXN: 142)

- (R) Rehabilitation of 200 BOBRN wagons at Sick Line, BRWD depot through outsourcing: BRWD डिपो के सिक लाइन में 200 BOBRN वैगनों का पुनर्वास आउटसोर्सिंग के माध्यम से**

Location/स्थान	Sick Line, BRWD/DHN Division/सिक लाइन, बरवाडीह/धनबाद मंडल
LOA Number & Date/एलओए संख्या एवं तिथि	27/05/2023
Date of Commencement of work/कार्य प्रारंभ की तिथि	25/08/2023
Work Progress/कार्य प्रगति	168 wagons repaired/ वैगनों का अनुरक्षण किया गया

- (S) Rehabilitation of 700 BOXNHL wagons at Sick Line, PEH depot through outsourcing: पाथरडीह डिपो के सिक लाइन में 700 बोकसनएचएल वैगनों का पुनर्वास आउटसोर्सिंग के माध्यम से:**

Location/स्थान	Sick Line, PEH/DHN Division/सिक लाइन, पाथरडीह/धनबाद मंडल
LOA Number & Date/एलओए संख्या एवं तिथि	14/07/2023
Date of Commencement of work/कार्य प्रारंभ की तिथि	23/11/2023
Work Progress/कार्य प्रगति	700 wagons repaired/वैगनों का अनुरक्षण किया गया

- (T) Door Height Reduction and Door Blocking of BOXN/HL wagons at Sick Line through outsourcing:**

Location/स्थान	Sick Line, OBRA & PEH/DHN Division/सिक लाइन, ओबराडैम एवं पाथरडीह/धनबाद मंडल
LOA Number & Date/एलओए संख्या एवं तिथि	04/09/2025
Date of Commencement of work/कार्य प्रारंभ की तिथि	08/11/2025
Work Progress/कार्य प्रगति	Door Height Reduced/डोर हाइट कम करना: 667 (273-N, 394-HL) Door Blocked/डोर ब्लॉक किये गए: 435 (144-N, 291-HL)

(U) Wheel impact load Detector System (WILD)/व्हील इम्पैक्ट लोड डिटेक्टर सिस्टम (WILD):

Supplier/सप्लायर	New Device under procurement
Location/स्थान	Km 277/1-3 near Chianki (CNF) on up main line किलोमीटर 277/1-3 उप मेल लाइन चियांकी
AMC with O.E.M. ओईएम की ऐएमसी	--

(V) Hot Axle Box Detector (HABD): 07 Nos. installed at different locations over Dhanbad Division and has started functioning/ हॉट एक्सल बॉक्स डिटेक्टर (HABD): धनबाद डिवीजन के विभिन्न स्थानों पर 07 संख्या स्थापित किए गए हैं और ये कार्य करना प्रारंभ कर चुके हैं।

Location/स्थान	Date of Commissioning कमिशनिंग की तिथि
DEMU Km No. 211/21-23 डेमू किलोमीटर 211/21-23	06/07/2023
Between KCKI-CNF 6m from Pole No. 276/29 केचकी एवं चियांकी के बीच पोल संख्या 276/29 से छह मीटर दूर	03/07/2023
Between CRP-TELO Km 12/12-12/14 near SSP Room चाद्रपुरा एवं तेलों के बीच किलोमीटर 12/12-12/14 एस एस पी रूम के नजदीक	03/08/2023
BHKD between Km 112/05-112/07 भुरकुंडा किलोमीटर 112/05-112/07 के बीच	28/07/2023
In between MWF Adv Starter to SSP Room मकरदहा एडवांस स्टार्टर और एस एस पी रूम के बीच	05/07/2023
DSME/दसरा	26/06/2024
PDMA/पदमा	08/07/2024
ARGD/अरगड्डा	11/10/2025
DSME/दसरा (2 nd Up)	18/05/2026
DSME/दसरा (Dn)	18/05/2026

Location/ स्थान	DEMU, KCKI, TELO, BHKD, MWF, DSME, PDMA डेमू, केचकी, चाद्रपुरा, भुरकुंडा, मकरदहा, दसरा, पदमा,	ARGD, DSME (2 nd Up), DSME (Dn) अरगड्डा, दसरा (2रा अप), दसरा (डाउन)
Supplier सप्लायर	M/s IQ Net Systems, Chennai, मेस्सर्स आई क्यू नेट सिस्टम, चेन्नई GeM contract No. 511687702754930, जेम कॉन्ट्रैक्ट संख्या Dt./ दिनांक 20/04/23 (IREPS PO No. 39235251200354, Dt. 17/05/23) आई ओआरओ ईओ पीओ एसओ क्रय आदेश संख्या	Autolite Enterprise-Rajkot ऑटो लाइट इंटरप्राइजेज राजकोट Autolite, G-535, Road D-2, Kishan Gate, ऑटो लाइट, जी-535, रोड डी-2, किसान गेट, GIDC Metoda, Kalawad Road Lodhika, जी आई डी सी मेटोदा, कलावाद रोड लोदिका Rajkot, Gujarat, 360021 राजकोट, गुजरात 360021 (Industry type: MSE) इंडस्ट्री प्रकार – एम एस ई

A. DISASTER MANAGEMENT ACTIVITIES

आपदा प्रबंधन गतिविधियाँ

- **LOCATION OF ART/ARMV/SPARMV/CRANE/BULLDOZER/EXCAVATOR/FIRE FIGHTING**
- एआरटीअग्निशमन की स्थिति/खुदाई यंत्र/बुलडोजर/क्रेन/एसपीएआरएमवी/एआरएमवी/

Base Station आधार स्टेशन	ART एआरटी	SPARMV एसपीएआरएमवी	ARMV एआरएमवी	Fire Fighting अग्निशमन	140T Crane 140 टन क्रेन	Bulldozer बुलडोजर	Excavator खुदाई यंत्र	RARV दुर्घटना राहत सड़क वाहन
Dhanbad धनबाद	√	√	X	X	√	√	√	X
Gomoh गोमो	√	X	X	√	X	X	X	√
Barkakana बरकाकाना	√	X	X	X	X	X	X	√
Barwadih बरवाडीह	√	X	√	X	√	X	X	X
Chopan चोपन	√	√	X	X	X	X	X	X
SGRL सिंगरौली	X	X	X	X	X	X	X	√

- **Position of Accident Relief Trains, Medical Van & Breakdown Crane:**

दुर्घटना राहत ट्रेनों, मेडिकल वैन और ब्रेकडाउन क्रेन की स्थिति

Base Station आधार स्टेशन	Class क्लास	Type of HRE एच आर इ का प्रकार	Make of HRD एच आर डी का निर्माता	140T Crane 140 टन क्रेन	Bulldozer बुलडोजर	Excavator खुदाई यंत्र	Exit निकास
		Make निर्माता	Make निर्माता				
Dhanbad धनबाद	A	BEMCO-02 sets	Holmatro	Gott. Wald (JMP)	Yes	Yes	Double दो निकास
Gomoh गोमो	B	BEMCO-01 set	Holmatro	--	--	--	Double दो निकास
Barkakana बरकाकाना	B	MFD-01 set	Holmatro	--	--	--	Single (Kalka/E) एक निकास(कालका एंड)
Barwadih बरवाडीह	A	MFD-01 set	Holmatro	New G ott. wald	--	--	Double but Crane single exit at KKK/E. दो निकास परन्तु क्रेन का एक ही निकास कालका एंड में
Chopan चोपन	B	MFD-01 set	Holmatro	--	--	--	Double दो निकास

Road ARV was commissioned at SGRL Depot on 03/08/2021 & ARRV GMO arrived GMO from 02/07/2025, Details of restoration work during 2026-27 is as below:

दुर्घटना राहत सड़क वाहन को 03/08/2021 को SGRL डिपो में कमीशन किया गया और GMO 02/07/2025 से GMO डिपो में कार्य करना प्रारंभ किया। 2026-27 के दौरान किए गए पुनर्स्थापन कार्य का विवरण निम्नलिखित है:

Type of Restoration/Repair पुनर्स्थापन/अनुरक्षण के प्रकार	Current Month/वर्तमान माह				Cumulative 25-26/संचयी 25-26			
	ARRV SGRL दुर्घटना राहत सड़क वाहन सिंगरौली	ARRV GMO दुर्घटना राहत सड़क वाहन गोमो	ARRV BRKA दुर्घटना राहत सड़क वाहन गोमो	Total कुल	ARRV SGRL दुर्घटना राहत सड़क वाहन सिंगरौली	ARRV GMO दुर्घटना राहत सड़क वाहन गोमो	ARRV BRKA दुर्घटना राहत सड़क वाहन गोमो	Total कुल
Loco Derailment लोको अवपथन		02	02	04		02	02	04
Wagon Derailment वैगन अवपथन	01	03		04	01	03		04
Adapter Shifted एडाप्टर शिफ्टेड								
PU Pad Workout पी यु पैड वर्कआउट								
Wheel Change चक्का बदलना								
Trolley Shifted ट्राली शिफ्टेड								
Centre pivot workout सेंटर पाइवोट वर्कआउट								
EM Pad change ई एम पद बदलना								
Outer & Inner spring आउटर एवं इनर स्प्रिंग बदलना								
Loco Axle Lock लोको अक्सल लॉक								
BVZI repair बीवीजेडआई अनुरक्षण								
Loco Pinion cutting लोको पिनियन को काटना								
Salvaging साल्वेजिंग			01	01			01	01
Total/कुल	01	05	03		01	05	03	09

➤ **Position of ARMV & SPARMV:**
ऐ आर एम वी एवं एस पी आर एम वी की स्थिति:

ARMV/ ऐ आर एम वी

SN क्र०	Base Station आधार स्टेशन	Make of HRD एच आर डी के निर्माता	D.O.C. कॉमिसनिंग की तिथि
1.	BRWD बरवाडीह	Holmatro-1 & Lukas-01 होलमात्रो -1 एवं लुकास -1	2018 & 2008

SPARMV/ एस पी आर एम वी

SN क्र०	Base Station आधार स्टेशन	D.O.C. कॉमिसनिंग की तिथि	Make of HRE एच आर ई के निर्माता	Make of HRD एच आर डी के निर्माता
1.	DHN धनबाद	21/12/16	BEMCO-1 Set (D.O.C.: 18/07/18) बेम्को - 1 सेट (कॉमिसनिंग की तिथि: 18/07/18)	Holmatro-01 (D.O.C.:17/03/18) होलमात्रो-01 (कॉमिसनिंग की तिथि: 17/03/18) Lukas-01 (D.O.C: 14/08/08) लुकास - 01 (कॉमिसनिंग की तिथि: 14/03/08)
2.	CPU चोपन	04/03/20	BEMCO-1 Set (D.O.C.: 21/11/21) बेम्को - 1 सेट (कॉमिसनिंग की तिथि: 21/11/21)	Holmatro-01 (D.O.C.: 27/03/18) होलमात्रो-01 (कॉमिसनिंग की तिथि: 27/03/18) Lukas-01 (D.O.C.:10/03/10) लुकास - 01 (कॉमिसनिंग की तिथि: 10/03/10)

➤ **Position of 140T Break Down Crane:**
140T ब्रेकडाउन क्रेन की स्थिति

Location स्थान	Crane Number क्रेन संख्या	Make & Model निर्माता एवं मॉडल	AMC status of Main engine मुख्य इंजन के ऐ एम सी स्थिति	Maintenance schedule & periodicity रख रखाव अनुसूची और-आवृत्ति	Outsourced/ Departmental आउटसोर्स / विभागीय
DHN धनबाद	143001 Old model पुराना मॉडल (DOC: 10/9/99)	Main Eng.- Cummins; मुख्य इंजन कम्मिंस Model-NTA मॉडल -एन टी ऐ 855 FFC एफएफसी	14/12/22 to 14/12/25, Extd upto 30/06/26 M/s Garuda Power Pvt. एम/एस गरुड़ा पावर प्रा.	Quarterly, Half yearly & Yearly	Outsourced आउटसोर्स
		SLI system एस एल आई सिस्टम	19/09/2023 to 18/09/2026 Mechanica Systems – Pune मेकानिका सिस्टम्स – पुणे	Quarterly त्रैमासिक	Outsourced आउटसोर्स
BRWD बरवाडीह	142267 upgraded design उन्नत डिजाइन (DOC: 1998) कॉमिसनिंग की तिथि : 1998	Main Eng.- Cummins; Model-NTA 855 LB मुख्य इंजन कम्मिंस मॉडल एन टी ऐ 855 एल बी	14/12/22 to 14/12/25 Extd upto 30/06/26 M/s Garuda Power Pvt. एम/एस गरुड़ा पावर प्रा.	Quarterly, Half yearly & Yearly त्रैमासिक, अर्धवार्षिक एवं वार्षिक	Outsourced आउटसोर्स
		SLI system एस एल आई	At JMP Shop for POH from 04/05/23. पी ओ ओ एच के लिए दिनांक 04/05/23 से जमालपुर वर्कशॉप में भेजा गया है	Quarterly त्रैमासिक	Outsourced. आउटसोर्स
